


**Календарный план проекта №0015
"Строительство по объекту "Центр спортивной
акробатики Республики Алтай"**

Ид.	СдФ	Название задачи	Длительность	Начало	Окончанием	Название	ресурсов	% заверш.
0	0	ПРОЕКТ №0015 Центр акробатики	656 Дн	6.06.15	29.12.17			28%
1	1	Начало проекта	0	дней	26.06.15	26.06.15	Вайдуров А.В.	100%
2	2	Проектно-изыскательские работы	0	дней	26.06.15	02.07.15	Вайдуров А.В.	100%
3	3	Прожождение государственной экспертизы	17	дней?	03.07.15	27.07.15	Пн Вайдуров А.В.	100%
4	4	Предоставление заявки на получение средств в ОАО "Газпром"	98	дней	30.07.15	14.12.15	Н.П.Языкова О.С.Айташева	100%
5	5	Проведение конкурсных процедур	80	дней?	21.04.16	10.08.16	Вайдуров А.В.	81%
6	5.1	Размещение закупки в единой информационной системе	11	дней	21.04.16	05.05.16	А.В.Вайдуров А.В.	100%
7	5.2	Процедура закупки	41	дней?	05.05.16	01.07.16	Мызин А.В.	100%
8	5.3	Повторная процедура закупки	18	дней	04.07.16	27.07.16	Ср Мызин А.В.	70%
9	5.4	Заключение государственного контракта	10	дней	28.07.16	10.08.16	Ср Вайдуров А.В.	0%
10	5.5	Окончание конкурсных процедур	0	дней	10.08.16	10.08.16	Ср Вайдуров А.В.	0%
11	6	Выполнение работ по строительству объекта	362	дней?	11.08.16	29.12.17	Пт Вайдуров А.В.	0%
12	6.1	Подготовительные работы	10	дней	11.08.16	24.08.16	Вайдуров А.В.	0%
13	6.2	Земляные работы	15	дней	18.08.16	07.09.16	Вайдуров А.В.	0%
14	6.3	Строительно-монтажные работы	208	дней	22.09.16	10.07.17	Пн Вайдуров А.В.	0%
15	6.4	Технологическое присоединение к канализационному	14	дней?	24.10.16	10.11.16.	Чт Вайдуров А.В.	0%
16	6.5	Технологическое присоединение к газовой котельной	14	дней?	24.10.16	10.11.16	Чт Вайдуров А.В.	0%
17	6.6	Благоустройство	23	дней	27.03.17	26.04.17	Вайдуров А.В.	0%
18	6.7	Подписан акт сверки выполненных работ	0	дней	18.07.17	18.07.17	Вт Вайдуров А.В.	0%
19	6.8	Поставка оборудования	40	дней	20.04.17	14.06.17	Вайдуров А.В.	0%
20	6.9	Подписан акт сверки оборудования	0	дней	14.06.17	14.06.17	Ср Вайдуров А.В.	0%
21	6.1	Получение заключения органа государственного строительного надзора	20	дней	19.07.17	15.08.17	Ср Вайдуров А.В.	0%
22	6.1	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию	5	дней	17.08.17	23.08.17	Чт Вайдуров А.В.	0%
23	6.1	Регистрация права собственности Республики Алтай	91	дней	25.08.17	29.12.17	Пт Вайдуров А.В.	0%
24	7	Окончание проекта	0	дней	29.12.17	29.12.17	Вайдуров А.В.	0%

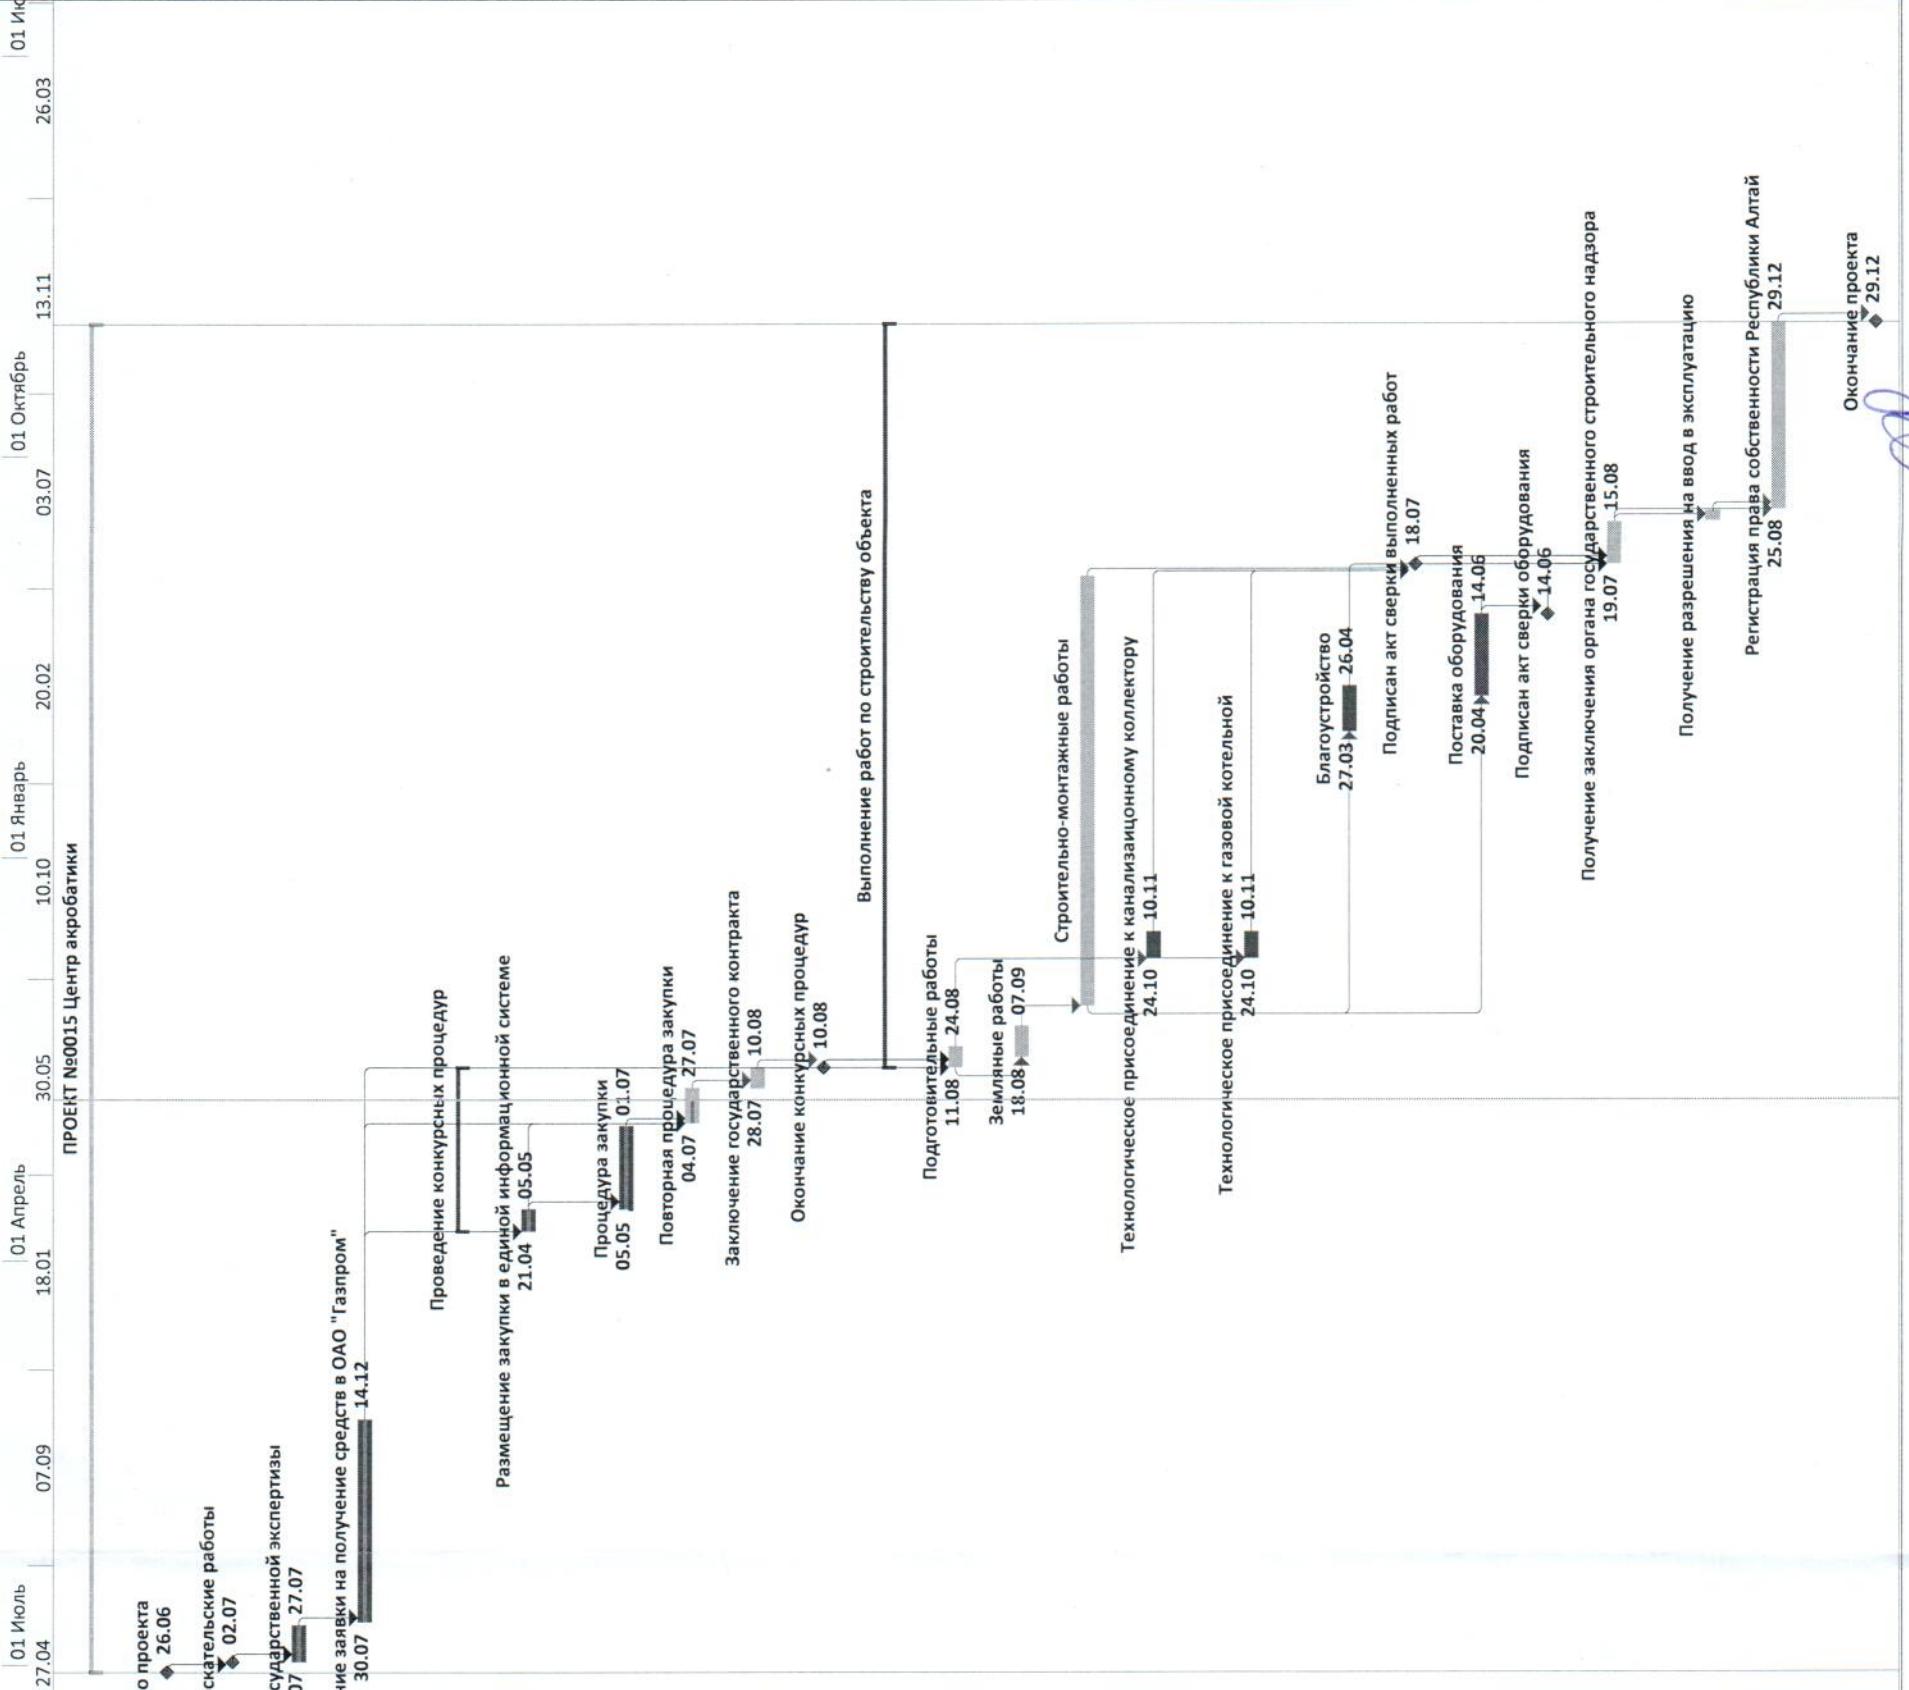

Согласовано:
Заказчик проекта Кондратьев Н.П. " _____ 2016 г.
Руководитель проекта Карамшин А.С. " _____ 2016 г.

Руководитель Проектного офиса Юрий Рогарь Ф.Н. " _____ 2016 г.
